


Verlag van de werkzaamheden aanleg Camping Het Klaverblad

Periode van 2 januari 2012 t/m 10 februari 2012 (Deel 5)

Week 5 6 februari

Er is weer heel wat gedaan, vloertegels liggen er bijna allemaal in. Er is een hele grote bak gemaakt waar alle afvoer, ontluchting en ventilatie pijpen op gemonteerd zijn. De bar krijgt steeds meer vorm.



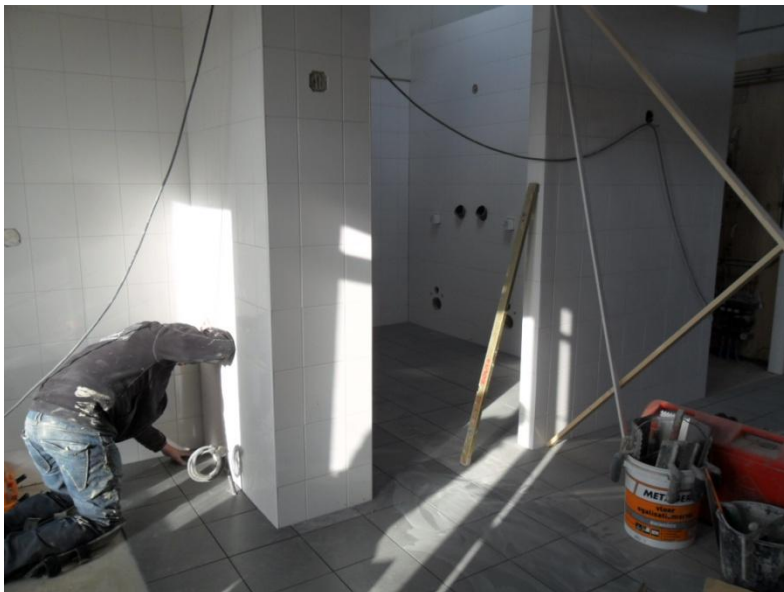



Technische ruimte
sanitairruimte camping



Week 4 30 januari

De tegels worden in gepoetst. De installatiewerkzaamheden gaan voorspoedig. Vrijdags valt de winter in, het gaat sneeuwen en het is zeer koud, min 23,8 graden.





Met eendrachtige samenwerking worden de drains geplaatst




Voor de eerste keer deze winter sneeuwt het. Het zeer koud min 23,8 graden.

Week 4 23 januari

In deze week zijn de plafonds gespact. Het tegels plakken gaat goed, het ziet er allemaal perfect uit. Ook is de firma Meijerman aan het werk om de installatie er op tijd in te krijgen.




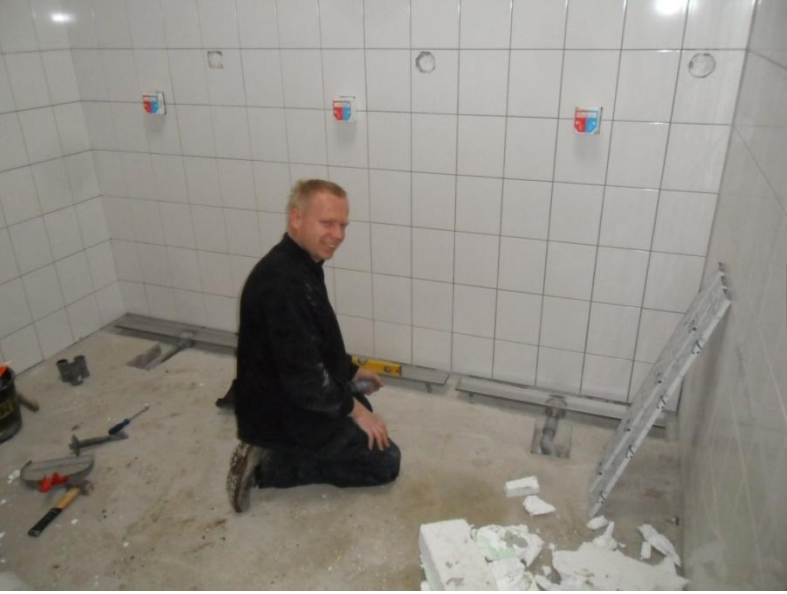

Week 3 16 januari

Deze week is een belangrijk deel gemetseld namelijk de bar. Hij moet natuurlijk nog verder afgewerkt worden maar het begin is er. Verdere werkzaamheden natuurlijk het tegels plakken, vooral nu het sanitairgedeelte van de camping. De firma Meijerman is het leidingwerk in de technische ruimte aan het monteren.



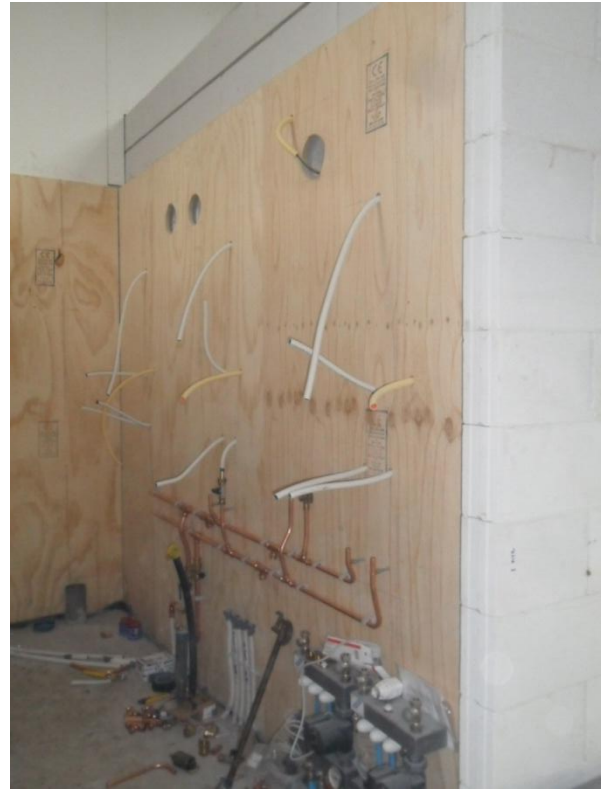

Week 2 11 januari

Afgelopen week is de schaftkeet opgehaald, het grote werk zit erop. Wat nu volgt is het plakken van tegels en het installatiewerk. Verder zijn er nog een aantal aftimmerwerkzaamheden te doen.





Week 1 2 januari

In de eerste week van het nieuwe jaar wordt er een begin gemaakt met het plakken van de wandtegels. De toiletgroep, bijkeuken en de keuken van de recreatieruimte worden als eerste betegeld. De Frima Meijerman is in de tussentijd bezig met de elektrische installatie in de recreatieruimte.





